

АНЕКС бр. 3.1 ЗА ОБЈЕКАТ

1/2014-653
03.02. 2014
БЕОГРАД, Миладинов бр. 1/6


„Изградња вијадукта у км 59+159,40 и тунела „Чортановци“ на деоници Стара Пазова - Нови Сад, у оквиру реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне железничке пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница”

уз Уговор о извођењу радова на изградњи железничке инфраструктуре и испоруци дизел-моторних возова бр. 300/2013-427/1 од 10.12.2013. године

ДОПОЛНИТЕЛНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3.1 ПО ОБЪЕКТУ

«Строительство виадукта на км 59+159,40 и тоннеля «Чортановци» на участке Стара Пазова - Нови Сад, в рамках реконструкции, модернизации и строительства двухпутной железной дороги Белград – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Государственная граница»

к Контракту на выполнение работ по строительству железнодорожной инфраструктуры и поставку дизельных поездов №300/2013-427/1 от 10.12.2013г.

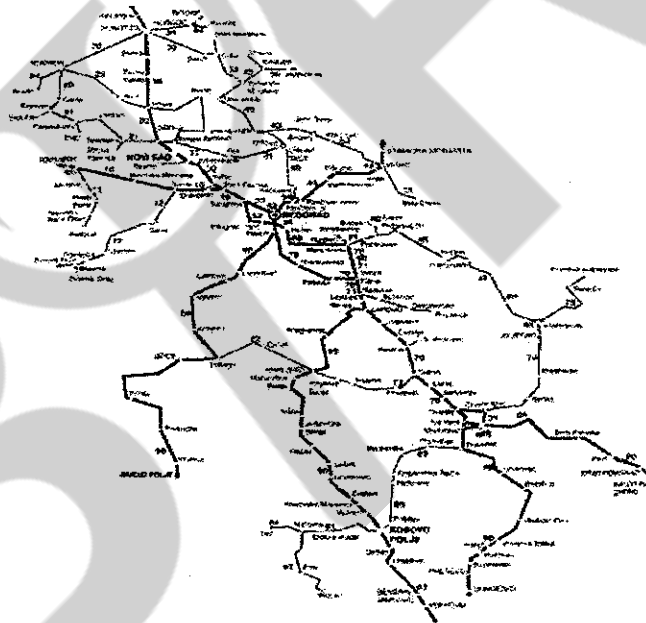

*Својеручно
С.П.*

Свијановић М.Б.

[Signature]

АНЕКС бр. 3.1 ЗА ОБЈЕКАТ

„Изградња вијадукта у км 59+159,40 и тунела „Чортановци“ на деоници Стара Пазова - Нови Сад, у оквиру реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне железничке пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница“

уз Уговор о извођењу радова на изградњи железничке инфраструктуре и испоруци дизел-моторних возова бр. 300/2013-427/1 од 10.12.2013. године

Овај Анекс бр. 3.1 за Објекат „Изградња вијадукта у км 59+159,40 и тунела „Чортановци“ на деоници Стара Пазова - Нови Сад, у оквиру реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне железничке пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница“ (у даљем текст: Анекс бр. 3.1) уз Уговор о извођењу радова на изградњи железничке инфраструктуре и испоруци дизел-моторних возова (у даљем тексту: Уговор) који је закључен у оквиру потписаног Међувладиног Споразума између Владе Руске Федерације и Владе Републике Србије о одобрењу Влади Републике Србије државног извозног кредита од 11.01.2013. године за финансирање испорука роба, радова и услуга за „Железнице Србије“ од (потврђено на територији Републике Србије Законом о „Потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије“ од 15. марта 2013. године, који је објављен у Службеном гласнику РС – Међународни уговори бр. 3/13), узимајући у обзир „Протокол о изменама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу Влади Републике Србије државног извозног кредита од 11.01.2013“ од 30.12.2016.

закључен __. фебруара 2017. год. у Београду између Друштва са ограниченом одговорношћу „РЖД Интернешнл“, правног лица, регистрованога у складу са законом Руске Федерације (матични број: 1127747085179), са седиштем на адреси: Архангелскиј переулук 10А, 101000 Москва, Руска Федерација, које на основу Статута заступа генерални директор Сергеј Алексејевич Павлов (у даљем тексту: Извођач) и Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура Железнице Србије“, Београд, правног лица регистрованога у складу са законом Републике Србије (матични број: 21127094), са седиштем на адреси: Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, које на основу Статута заступа в.д. генералног директора Душан Гарибовић (у даљем тексту: Инвеститор).

Анекс бр. 3.1 за Објекат има приоритет у односу на Уговор, у делу услова, којима се уређују правни односи Уговорних страна током извођења Радова, укључујући испоруку Главних пројеката.

			гарантийных обязательств по Объекту/Части Объекта.
	12. Измене и корекције		12. Изменения и корректировка
12.4 Трошкови за непредвиђене додатне обиме и/или врсте Радова	<p>Тачке 12.4 Уговора мења и гласи:</p> <p>Цена Анекса бр. 3.1 обухвата износ Трошкова за непредвиђене додатне обиме и/или врсте Радова у висини од 15% (петнаест процената) од цене Радова за Објекат бр. 3.1, наведене у подтачки 1 Тачке 13.1 Анекса бр. 3.1.</p> <p>У случају да се премаши износ Трошкова за непредвиђене додатне обиме и/или врсте Радова, који је договорен Анексом бр. 3.1, Цена Анекса бр. 3.1 мора бити на одговарајући начин коригована у складу са тачком 13.1 Уговора.</p> <p>Износ трошкова за непредвиђене додатне обиме и/или врсте Радова Извођач користи уз сагласност Инвеститора у случају да постоји потреба за извођењем непредвиђених додатних обима и/или врста Радова, који нису предвиђени Пројектном и/или Предрачунском и/или Техничком документацијом, а који су потребни за извођење и завршетак свих Радова на Објекту.</p> <p>Уколико Извођач утврди да мора да изведе непредвиђене додатне обиме и/или врсте Радова, који нису предвиђени Пројектном и/или Предрачунском и/или Техничком документацијом, а који су неопходни за извођење и завршавање свих Радова на Објекту, Извођач о томе</p>	12.4 Расходи на непредвиденные дополнительные объемы и/или виды Работ	<p>Изложить Пункт 12.4 Контракта в следующей редакции:</p> <p>Цена Дополнительного соглашения № 3.1 включает в себя сумму Расходов на непредвиденные дополнительные объемы и/или виды Работ в размере 15% (пятнадцать процентов) от цены Работ по Объекту № 3.1, указанной в подпункте 1 Пункта 13.1, Дополнительного соглашения № 3.1.</p> <p>В случае превышения согласованной условиями Дополнительного соглашения № 3.1 суммы Расходов на непредвиденные дополнительные объемы и/или виды Работ Цена Дополнительного соглашения № 3.1 должна быть соответствующим образом откорректирована в соответствии с Пунктом 13.1 Контракта.</p> <p>Сумма Расходов на непредвиденные дополнительные объемы и/или виды Работ используется Подрядчиком с согласия Заказчика в случае выявления необходимости выполнения непредвиденных дополнительных объемов и/или видов Работ, не предусмотренных Рабочей и/или Сметной и/или Технической документацией, но необходимых для выполнения и завершения всех Работ по Объекту.</p> <p>В случае выявления Подрядчиком необходимости выполнения непредвиденных дополнительных объемов и/или видов Работ, не предусмотренных Рабочей и/или Сметной и/или Технической документацией, но необходимых для выполнения и</p>

Handwritten initials/signature in the bottom left corner.

Handwritten signature in the bottom right corner.

	<p>обавештава Инвеститора.</p> <p>При томе се у обавештењу Извођача наводи вредност, разлози настанка и образложење потребе за непредвиђене додатне обима и/или врста Радова.</p> <p>За сваки случај Трошкова за непредвиђене додатне обиме и/или врсте Радова, који нису већи од 0,5% од цене Радова, Инжењер, а у случају да су већи од 0,5% од цене Радова, али да нису већи од 15% од цене Радова, Директор пројекта испред Инвеститора разматра вредност коју је предложио Извођач и даје налог да Извођач изведе Радове и да их процени према одредбама Тачке 11.3.</p> <p>За сваки случај Трошкова за непредвиђене додатне обиме и/или врсте Радова, рок за достављање Извођачу образложеног званичног одговора Инвеститора у писаној форми на основу резултата разматрања сваког одговарајућег обавештења Извођача, износи највише 15 (петнаест) Дана, од тренутка када Инвеститор добије званично обавештење од Извођача.. Уколико у року, наведеном у овом ставу Тачке 12.4 Уговора, Извођач није добио званично саопштење од Инвеститора (такође укључујући и поруке послате факсом или преписку путем електронске поште), која се тиче обавештавања Извођача о потреби за Трошковима за непредвиђене додатне обиме и/или врсте Радова, то значи, да је Извођач добио званично одобрење Инвеститора за извођење додатних обима и/или врста Радова везано за вредност и обиме, наведене у одговарајућем обавештењу Извођача.</p>	<p>завршения всех Работ по Объекту, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика.</p> <p>При этом в уведомлении Подрядчика указывается стоимость, причины возникновения и обоснование необходимости непредвиденных дополнительных объемов и/или видов Работ.</p> <p>Для каждого случая Расходов на непредвиденные дополнительные объемы и/или виды Работ, не превышающих 0,5% от цены Работ, Инженер, а в случае, превышающем 0,5% от цены Работ, но не более 15% от цены Работ, Директор проекта со стороны Заказчика согласовывает предложенную Подрядчиком стоимость и дает указание о выполнении Подрядчиком Работ и их оценке в соответствии с положениями Пункта 11.3.</p> <p>Для каждого случая Расходов на непредвиденные дополнительные объемы и/или виды Работ срок направления Подрядчику мотивированного письменного официального ответа Заказчика по результатам рассмотрения каждого соответствующего уведомления Подрядчика должен составлять не более 15 (пятнадцать) Дней, с момента получения Заказчиком официального уведомления от Подрядчика. В случае если в срок, указанный в настоящем абзаце Пункта 12.4 Контракта, Подрядчиком не получено официальное сообщение от Заказчика (в том числе включая факсимильные сообщения или пересылку электронной почтой) в отношении уведомления Подрядчика о необходимости Расходов на непредвиденные дополнительные объемы и/или виды Работ, это означает, что Подрядчиком получено официальное согласие Заказчика на выполнение дополнительных объемов и/или видов Работ по стоимости и в объемах, указанных в соответствующем уведомлении Подрядчика.</p>
--	--	--
